



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

299003, г. Севастополь, ул. Шварца/Пирогова, д. 26/3

e-mail: ksp@ksp-sev.ru

«16» 09 2024

№ 1072

НА № _____

ОТ «__» _____ 20__

Председателю
Законодательного Собрания
города Севастополя

НЕМЦЕВУ В.В.

О направлении информации


Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Закона города Севастополя от 09.06.2023 № 759-ЗС «О Контрольно-счетной палате города Севастополя» направляем Вам информацию о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ исполнения федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» за I полугодие 2024 года.

Приложение: на 40 листах в 1 экз.

Председатель

Ю.В.КОКАРЕВА



Контрольно-счетная палата города Севастополя

Информация о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ исполнения федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» за I полугодие 2024 года

Севастополь
2024



Содержание

Общие положения.....	3
1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих реализацию государственных программ города Севастополя в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».....	4
2. Анализ соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий Программы бюджету города Севастополя из федерального бюджета в I полугодии 2024 года.....	5
3. Анализ объемов финансового обеспечения, предусмотренных в Программе по городу Севастополю, в разрезе направлений социально-экономического развития города Севастополя.....	7
4. Анализ утвержденных и фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий государственных программ города Севастополя в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя».....	11
5. Анализ кассового исполнения БА в разрезе ГРБС, ответственных за реализацию объектов (мероприятий) в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», за I полугодие 2024 года.....	14
6. Анализ неисполненных бюджетных назначений по расходам на реализацию мероприятий Программы по состоянию на 01.07.2024.....	15
7. Анализ исполнения соглашений в части ввода в эксплуатацию объектов и реализации мероприятий Программы в 2024 году.....	16
Выводы.....	20



Общие положения

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг и анализ исполнения федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» за I полугодие 2024 года проводится на основании пункта 10 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Севастополя на 2024 год.

Цель: определение эффективности исполнения федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2024 году.

Предмет: формирование, управление и распоряжение средствами бюджета города Севастополя, источником которых являются собственные средства бюджета города Севастополя и средства субсидии бюджету города Севастополя из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств города Севастополя по реализации перечня мероприятий федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее – Программа), софинансируемых с привлечением средств федерального бюджета.

Объект: органы государственной власти, организации и учреждения города Севастополя.

Критерии оценки:

законность – соблюдение норм действующего законодательства в ходе реализации мероприятий государственных программ города Севастополя в рамках федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»;

достоверность – соответствие фактических показателей отчетов о достижении значений показателей результативности и расходах средств субсидии, представляемых главными распорядителями бюджетных средств, показателям, утвержденным в Законе города Севастополя от 12.12.2023 № 790-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и в сводной бюджетной росписи города Севастополя на 2024 год.



Сокращения по тексту

ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», Программа – государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»;

Минстрой России – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Субсидия – субсидия на реализацию мероприятий федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»;

СМР – строительно-монтажные работы;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

Закон о бюджете города Севастополя - Закон города Севастополя от 12.12.2022 № 790-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

СБР – сводная бюджетная роспись бюджета города Севастополя;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

Государственная программа города Севастополя – ГП города Севастополя;

БА – бюджетные ассигнования.

1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих реализацию государственных программ города Севастополя в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»

1.1 Правительством Российской Федерации утверждена государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»¹, основной целью которой является преодоление социально-экономического отставания Крыма и доведение качества жизни населения до среднероссийского уровня.

Сроки реализации мероприятий Программы устанавливаются планом реализации федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Государственным заказчиком, главным распорядителем средств федерального бюджета определено Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»



1.2. Правительством Севастополя в 2024 году средства Субсидии в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» распределены по главным распорядителям бюджетных средств.²

Утвержден Порядок расходования средств Субсидии в рамках Программы на 2024-2026 годы³.

1.3. В СБР за I полугодие 2024 года утверждено распределение не использованных по состоянию на 01.01.2024 остатков средств Субсидии на реализацию мероприятий Программы (далее – восстановленные средства Субсидии) согласно 6 дополнительным соглашениям, вносящем изменения в соглашения, заключенные в 2022 и 2023 годах (2 соглашения и 4 соглашения соответственно) в объеме 46,3 млн рублей⁴.

2. Анализ соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий Программы бюджету города Севастополя из федерального бюджета в I полугодии 2024 года

2.1. По состоянию на 01.07.2024 Правительством Севастополя с Минстроем России заключено 9 соглашений о предоставлении в 2024 году бюджету города Севастополя субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию города Севастополя.

2.2. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств Республики Крым и г. Севастополя из федерального бюджета на 2024 год определен в размере 95 %, на плановый период на 2025 год – 93%, на 2026 год – 95%⁵.

2.3. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства и (или) объектам недвижимого имущества, софинансирование капитальных вложений по которым предусмотрено государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» и адресное (пообъектное) распределение субсидий по мероприятиям, реализуемым по направлению «прочие нужды» ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» (далее – адресное

² Постановление Правительства Севастополя от 05.02.2024 №23-ПП «О распределении средств субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование мероприятий федерального проекта «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя» по главным распорядителям бюджетных средств в 2024 – 2026 годах»

³ Постановление Правительства Севастополя от 05.02.2024 № 31-ПП

⁴ Постановление Правительства Севастополя от 11.06.2024 № 278-ПП «О распределении не использованных по состоянию на 01.01.2024 остатков средств субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование мероприятий федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по главным распорядителям бюджетных средств в 2024 году»

⁵ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.08.2023 № 2028-р.



распределение субсидий) утверждено приказом Минстроя России от 29.12.2023 № 1032/пр (далее – Приказ Минстроя России № 1032/пр, адресное распределение субсидий).

Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете Республики Крым и бюджете г. Севастополя бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения;

в) заключение соглашения.

Результатами использования Субсидии, предусмотренными соглашением, являются:

количество введенных в эксплуатацию объектов;

количество реализованных мероприятий⁶.

2.4. Согласно пункту 1.2 Соглашения Субсидия бюджету города Севастополя предоставлена в соответствии с перечнем мероприятий и объектов капитального строительства государственной собственности города Севастополя, реализуемых в рамках 13 государственных программ города Севастополя.

2.5. По состоянию на 01.07.2024 в 9 соглашений, заключенных Правительством Севастополя с Минстроем России, о предоставлении из федерального бюджета в 2024 - 2027 годах бюджету города федерального значения Севастополя субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию города Севастополя были внесены изменения 24 раза. 2 соглашения расторгнуты⁷.

2.6. На 01.07.2024 изменения объемов финансового обеспечения мероприятий Программы согласно дополнительным соглашениям, заключенным

⁶ Пункт 11 приложения №1 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» к государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

⁷ Соглашения от 26.12.2023 № 069-09-2024-378, 394.



в первом полугодии 2024 года с Минстроем России, не внесены в постановление Правительства Севастополя от 05.02.2024 № 23-ПП «О распределении средств субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование мероприятий федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по главным распорядителям бюджетных средств в 2024 - 2026 годах».

Таким образом, деятельность исполнительных органов государственной власти города Севастополя - ответственных ГРБС за реализацию мероприятий Программы обеспечена нормативными правовыми актами, соответствующими законодательству Российской Федерации, вместе с тем изменения объемов финансового обеспечения Программы, утвержденные дополнительными соглашениями в первом полугодии 2024 года, в постановление Правительства Севастополя №23-ПП не внесены.

3. Анализ объемов финансового обеспечения, предусмотренных в Программе, в разрезе направлений социально-экономического развития города Севастополя


3.1. Согласно адресному распределению субсидий общий объем финансирования Программы на развитие Республики Крым и города Севастополя на период 2022- 2026 гг. составляет 481 195,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 454 740,6 млн рублей (или 94,5%), из них восстановленные средства субсидии прошлых лет 2 617,1 млн рублей; средства бюджетов Республики Крым и города Севастополя – 26 454,9 млн рублей (или 5,5%).

3.2. С целью реализации государственной политики регионального развития по сокращению различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности, сокращению различий в уровне социально-экономического развития регионов, достижению необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации **на период 2022 - 2026 гг. в Программе утверждены предельные объемы финансирования для города Севастополя в сумме 116 735,1 млн рублей**, в том числе за счет средств федерального бюджета – 110 616,8 млн рублей (или 94,8%), средств бюджета города Севастополя – 6 118,3 млн рублей (или 5,2%).



Объемы ресурсного обеспечения мероприятий Программы, реализуемых на территории города Севастополя, в разрезе источников финансирования на период 2022 - 2026 гг. представлены на диаграмме №1.

Диаграмма №1, млн рублей

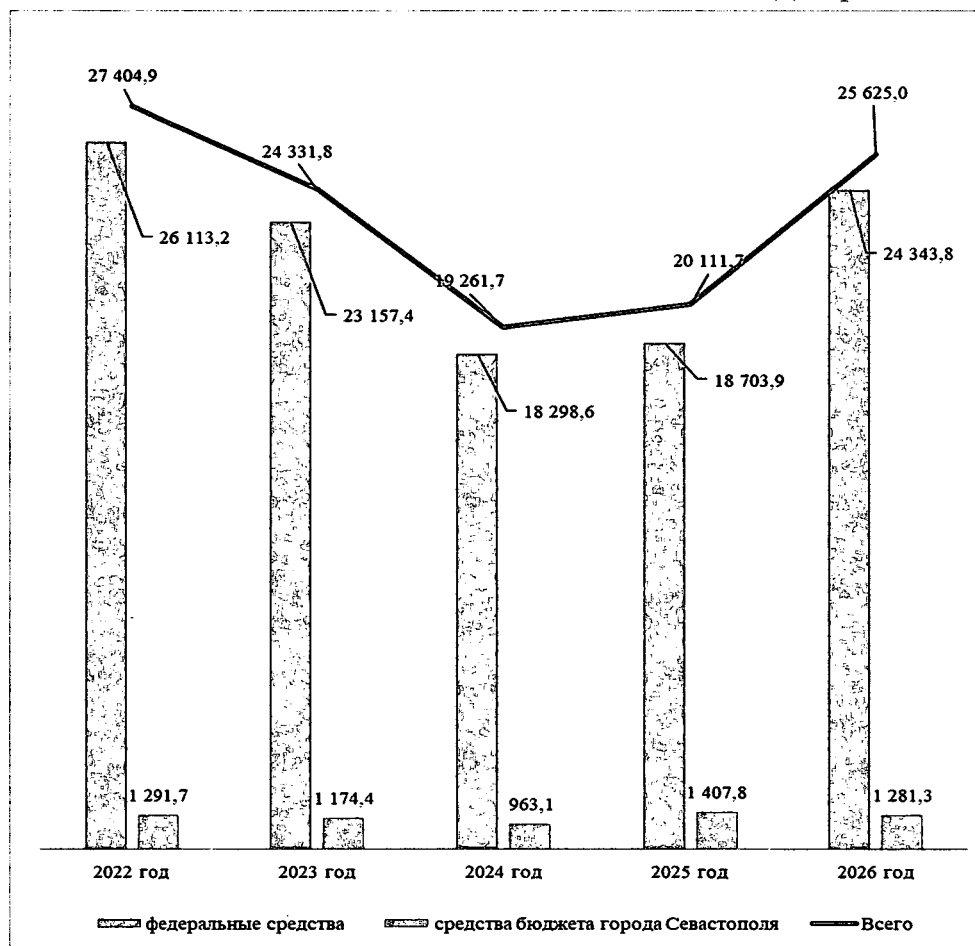

Согласно адресному распределению субсидий⁸ объемы финансирования реализации мероприятий Программы по городу Севастополю в 2024 году⁹ составили **19 261,7 млн рублей¹⁰**, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18 298,6 млн рублей (или 95%), что соответствует объемам финансирования, утвержденным в СБР по состоянию на 01.07.2024.

3.3. В первом полугодии 2024 года в объемы финансирования мероприятий Программы были **внесены изменения** согласно заключенным дополнительным соглашениям о предоставлении средств субсидии по разделу «Капитальные вложения». Объем финансирования уменьшен на 4 956,4 млн рублей (или на 25,7 %). По разделу «Прочие нужды» корректировки объемов финансирования не производились.

⁸ Приказ Министра России от 29.12.2023 № 1032/пр

⁹ По состоянию на 01.07.2023

¹⁰ Без учета восстановленных средств субсидии в 2024 году в объеме 46,3 млн рублей



**Сравнительная таблица объемов финансирования, утвержденных в
СБР и соглашениях, на 01.07.2024**

Таблица №2

№ п/п	Наименование мероприятий Программы	Уточненная СБР	Объем Субсидии согласно соглашениям с учетом восстановленных средств субсидии прошлых лет	Отклонение
1	2	3	4	6 (гр.4-гр3)
1	<i>Модернизация, реконструкция и строительство объектов газотранспортной системы</i>	1 950,9	1 452,6	- 498,4
2	<i>Обеспечение теплоснабжения</i>	662,1	637,0	- 25,1
3	<i>Обеспечение водоотведения</i>	3 042,4	2 235,5	- 806,9
4	<i>Обеспечение водоснабжением</i>	540,5	381,5	- 159,0
5	<i>Реализация плана мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения</i>	354,0	354,0	0,0
6	<i>Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя</i>	196,7	196,7	0,0
7	<i>Строительство и реконструкция дорог</i>	7 075,7	3 713,6	-3 362,1
8	<i>Развитие здравоохранения</i>	1 099,3	1 099,3	0,0
9	<i>Модернизация дошкольного образования</i>	204,0	164,0	- 40,0
10	<i>Модернизация общего образования</i>	172,7	107,7	- 65,0
11	<i>Обеспечение объектами социального назначения</i>	461,2	461,2	0,0
12	<i>Развитие объектов культуры</i>	426,2	426,16	0,0
13	<i>Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур"</i>	221,6	221,6	0,0
14	<i>Развитие физической культуры и спорта</i>	171,9	171,90	0,0
15	<i>Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе</i>	192,0	192,0	0,0
16	<i>Развитие комплекса связи и массовых коммуникаций</i>	0,1	0,1	0,0
17	<i>Создание промышленных парков</i>	50,1	50,1	0,0
18	<i>Создание яхтенной марины</i>	1 978,2	1 978,2	0,0
19	<i>Координация, управление и контроль реализации инвестиционных проектов ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя»</i>	357,25	357,25	0,0
20	<i>Мероприятия по ветеринарному и фитосанитарному надзору в г. Севастополе</i>	151,3	151,3	0,0
	Итого	19 308,0	14 351,6	-4 956,4

Наибольшее уменьшение Субсидии наблюдается в рамках мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог города Севастополя



на 3 362,1 млн рублей или в 1,9 раза относительно первоначальных объемов, утвержденных на данные цели в 2024 году, в основном за счет уменьшения финансирования по объекту «Строительство и реконструкция региональной автомобильной дороги «Севастополь-порт Камышовая бухта-бухта Казачья, км 0+000-км 3+500».

Справочно: по данному объекту на начало текущего года объем финансирования был предусмотрен в сумме 3 062,1 млн рублей. После внесения изменений финансирование по данному объекту в 2024 году не предусмотрено.

Также уменьшение наблюдается в рамках мероприятий по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы на 498,4 млн рублей или на 25,5%; мероприятий по обеспечению водоотведения, водоснабжения на 995,3 млн рублей или на 26,9%.

По состоянию на 01.07.2024 общий объем финансирования мероприятий Программы с учетом всех внесенных изменений в Соглашения и с учетом восстановленных средств субсидии прошлых лет составил **14 351,6** млн рублей¹¹, в том числе на капитальные вложения 13 640,4 млн рублей (или 95 %), в том числе федеральные средства 12 958,4 млн рублей и на прочие нужды 711,3 млн рублей (или 5 %), в том числе федеральные средства 675,7 млн рублей.

Информация об объектах, мероприятиях, предусмотренных в соглашениях на 2024 год, об объемах финансирования согласно соглашениям по состоянию на 01.07.2024 в разрезе видов работ и сроках реализации объектов и мероприятий представлена в приложении № 1.

3.4. Таким образом, по состоянию на 01.07.2024 общий объем **финансового обеспечения на реализацию 71 объекта капитальных вложений и 2-х мероприятий** (раздел Программы «Прочие нужды») с учетом изменений составил **14 351,6** млн рублей, в том числе:

1) **на капитальные вложения в размере 13 594,0 млн рублей**¹² на следующие виды работ:

- проведение ПИР по 12 объектам. Объем финансового обеспечения – 461,4 млн рублей или 3,2%;

- проведение СМР по 64 объектам¹³. Объем финансового обеспечения – 13 132,6 млн рублей или 91,5%.

На капитальные вложения за счет восстановленных средств субсидии прошлых лет в объеме **46,3** млн рублей: на проведение СМР по 8 объектам в сумме 46,1 млн рублей и на проведение ПИР по 1 объекту в сумме 0,2 млн рублей.


2) на реализацию 2 мероприятий **раздела «Прочие нужды»** - в объеме **711,3** млн рублей или 5%.

¹¹ Объемы финансирования на 2024 год 14 305,3 млн рублей (согласно допсоглашениям на 2024 год), сумма восстановленных средств субсидии (за 2022-2023 гг.) – 46,3 млн рублей. Итого 14 351,6 млн рублей

¹² Согласно соглашениям, заключенным на 2023 год без учета восстановленных средств субсидии

¹³ По 5 объектам предусмотрено финансирование и на ПИР, и на СМР



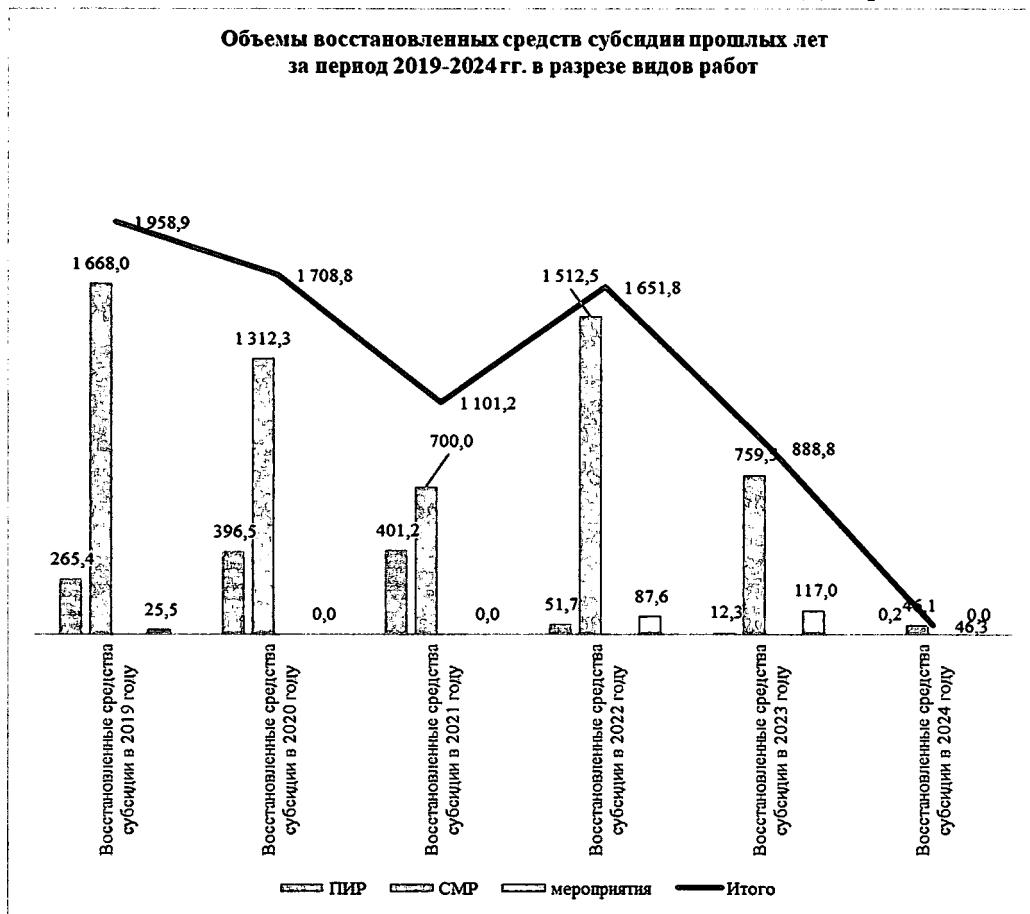

4. Анализ утвержденных и фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий государственных программ города Севастополя в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя»

4.1. По состоянию на 01.07.2024 в СБР программные расходы на реализацию мероприятий ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» утверждены в объеме 19 308,0 млн рублей (с учетом восстановленных средств субсидии прошлых лет – 46,3 млн рублей) или 24,2 % от общего объема утвержденных расходов в СБР на 01.07.2024 (79 721,8 млн рублей) и не соответствуют объемам финансирования мероприятий Программы, утвержденных в I полугодии 2024 дополнительными соглашениями (14 351,6 млн рублей (с учетом восстановленных средств субсидии прошлых лет – 46,3 млн рублей)).

4.2. За I полугодие 2024 года ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий Программы предусмотрено в 13 ГП города Севастополя (таблица № 3).



Таблица №3, млн рублей

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя	Утверждено в СБР на 01.07.2024	Кассовое исполнение на 01.07.2024	Уровень исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6
1	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя	6550,0	2156,0	32,9%	4 394,0
2	Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя	7272,4	930,3	13%	6 342,1
3	Развитие здравоохранения в городе Севастополе	1099,3	748,2	68,1%	351,1
4	Развитие образования в городе Севастополе	376,7	51,0	13,5%	325,7
5	Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения города Севастополя	461,2	436,8	94,7%	24,4
6	Развитие культуры города Севастополя	426,2	179,8	42,2%	246,4
7	Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе	171,9	110,0	64%	61,9
8	Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе	192,0	26,7	13,9%	165,3
9	Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе	2385,5	1892,7	79,3%	492,8
10	Развитие туризма города Севастополя	221,6	10,6	4,8%	211,0
11	Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя	151,2	0,0	0%	151,2
	Итого	19 308,0	6 542,1	33,9%	12 765,9

4.3. Наибольшие объемы ресурсного обеспечения согласно СБР утверждены на реализацию мероприятий двух ГП города Севастополя: «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в сумме 7 272,4 млн рублей или 37,7% от общего объема программных расходов (19 308,0 млн рублей) и «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» - 6 550,0 млн рублей или 33,9%.

4.4. **Кассовое исполнение** бюджета по расходам на реализацию мероприятий Программы по состоянию на 01.07.2024 составило **6 542,1 млн рублей или 33,9 %** от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного в сводной бюджетной росписи на данные цели (19 308,0 млн рублей).





4.5. За I полугодие 2024 года наблюдается как уменьшение уровня кассового исполнения бюджета по расходам на реализацию мероприятий Программы (на 8,4 процентного пункта (далее – п. п.)), так и уменьшение утвержденных объемов финансирования данных мероприятий на 8 333,2 млн рублей (или на 30,1%) в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

4.6. Наибольший уровень кассового исполнения средств Субсидии в I полугодии 2024 года наблюдается по ГП города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» 94,7% (или 436,8 млн рублей) от плана (461,2 млн рублей).

Справочно: по состоянию на 01.07.2023 также наибольший уровень исполнения наблюдался по ГП города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» 76,3% (или 417,0 млн рублей) от плана (546,7 млн рублей).

4.7. По ГП города Севастополя «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя» в I полугодии 2024 года кассовое исполнение по расходам, направленным на реализацию мероприятий Программы, не производилось.

Информация о государственных контрактах, заключенных в рамках реализации объектов и мероприятий ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», сроках начала и завершения реализации объектов и мероприятий, кассовом исполнении по состоянию на 01.07.2024 представлена в Приложении №2.



5. Анализ кассового исполнения БА в разрезе ГРБС, ответственных за реализацию объектов (мероприятий) в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», за I полугодие 2024 года


5.1. Согласно СБР по состоянию на 01.07.2024 средства Субсидии утверждены следующим главным распорядителям бюджетных средств:

- Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры город Севастополя (далее – ДТ и РДТИС) – 9 310,8 млн рублей (или 48,2 % от общего объема Субсидии, предусмотренного в 2024 году на реализацию мероприятий Программы);

- Департаменту капитального строительства города Севастополя (далее – ДКСС) – 9 104,7 млн рублей (или 47,2 %);

- Департаменту городского хозяйства города Севастополя (далее – ДГХС) – 892,5 млн рублей (или 4,6%).

Диаграмма №4, млн рублей

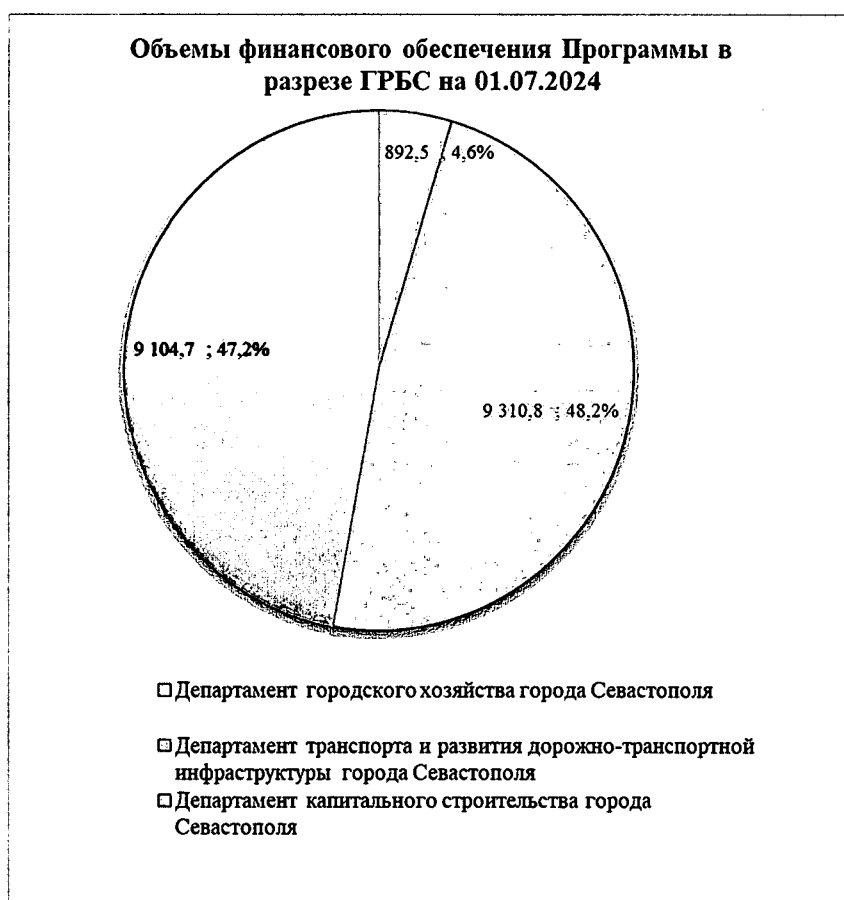



5.2. В I полугодии 2024 наибольший уровень кассового исполнения по расходам в рамках Программы сложился по ДГХС 100% (или 892,5 млн рублей) в связи с предоставлением субсидий: государственному унитарному предприятию города Севастополя «Севтеплоэнерго» на реконструкцию системы теплоснабжения в зоне действия Севастопольской ТЭЦ в объеме 583,5 млн рублей и государственному унитарному предприятию города Севастополя «Водоканал» на мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения в рамках социально-экономического развития города Севастополя в объеме 354,0 млн рублей.

5.3. В первом полугодии 2024 года ДТ и РДТИС снизил уровень кассового исполнения на 45,4 п. п. (29,2% в I полугодии 2024 года против 74,6% в I полугодии 2023 года). ДКСС увеличил уровень исполнения на 0,8 п. п. (32,2% в I полугодии 2024 году против 31,4% в аналогичном периоде 2023 года).

6. Анализ неисполненных бюджетных назначений по расходам на реализацию мероприятий Программы по состоянию на 01.07.2024

6.1. Объем неисполненных бюджетных назначений по расходам бюджета на реализацию мероприятий ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» составил 12 765,9 млн рублей (или 66,1%), что на 3 193,4 млн рублей (или на 20%) меньше



в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и на 3 977,9 млн рублей (или на 23,8%) меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Диаграмма № 6, млн рублей



Таким образом, за I полугодие 2024 года при уменьшении утвержденных объемов финансирования мероприятий Программы наблюдается уменьшение уровня исполнения средств Субсидии на реализацию мероприятий в рамках социально-экономического развития города Севастополя в сравнении с аналогичным периодом 2023, что свидетельствует о невысоком качестве управления объемами финансирования, направленными на реализацию мероприятий Программы, что повышает риски недостижения показателей результативности, утвержденных ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя».

7. Анализ исполнения соглашений в части ввода в эксплуатацию объектов и реализации мероприятий Программы в 2024 году

7.1. В первом полугодии 2024 года введено в эксплуатацию **5 объектов**: 4 объекта дорожного хозяйства: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта - Севастополь, 8 этап» (перенос на 2024 год); «Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 «Севастополь - порт Камышовая бухта» на км 4»; «Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 «Севастополь - порт



Камышовая бухта» на км 6»; «Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 «Севастополь - порт Камышовая бухта на км 7» (три объекта 2023 года) и один объект жилищно-коммунальной сферы «Мартыновский канализационный коллектор»(перенос на 2024 год).

7.2. По предварительным данным, согласно дополнительным соглашениям, заключенным с Минстроем России на 2024 год, запланировано ввести в эксплуатацию в 2024 году 18 объектов и реализовать 1 мероприятие.

Информация о текущем статусе объектов, подлежащих к введению в эксплуатацию в 2024 году, по состоянию на 01.07.2024 представлена в таблице № 4.

Таблица №4.

№ п/п	Наименование объекта Программы	Текущий статус объекта (риски неввода)
1	2	3
1	Газификация с. Верхнесадовое (низкое давление)	Строительная готовность - 55 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
2	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 2-я очередь	Строительная готовность - 20 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
3	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 3-я очередь	Строительная готовность - 76 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
4	Газификация сел Байдарской долины, село Озерное (низкое давление)	Строительная готовность - 99 %. Начата работа приемочной комиссии. Ввод в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
5	Газификация села Пироговка (низкое давление)	Строительная готовность - 29 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
6	Газификация сел Фруктовое и Поворотное	Строительная готовность - 80 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
7	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Большая Морская, 24	Получены положительные заключения ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» по проектной документации и результатам инженерных изысканий № 92-1-1-3-003083-2020 от 10.02.2020, достоверности сметной стоимости № 92-1-1-2-040755-2020 от 26.08.2020, повторная экспертиза достоверности определения сметной стоимости № 92-1-1-2-071633-2021 от 29.11.2021. Получение разрешения на строительство затрудняется в связи с расположением объекта в границах территории «Исторического поселения федерального значения город Севастополь». Срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
8	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта - Севастополь, 8 этап	Объект введен в эксплуатацию досрочно. РНВ № 91-00-523-2024/1 от 06.05.2024 г.



№ п/п	Наименование объекта Программы	Текущий статус объекта (риски неввода)
1	2	3
9	Строительство транспортной связи автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-209 "Столетовский проспект" и автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-222 "ул. Тараса Шевченко" с устройством транспортной развязки в одном уровне и реконструкцией участка автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-222 "ул. Тараса Шевченко"	Строительная готовность - 17 %. Основным проблемным вопросом выступает выкуп земельных участков и гаражных боксов в ГСК, ведутся судебные-претензионные работы. Ввод в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
10	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 64 Н-150 ул. Древняя	Строительная готовность - 65 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
11	Строительство подстанции №1 ГБУЗС "Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", пр-т Победы	Строительная готовность - 64 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
12	Детский сад в Гагаринском районе, ул. Вакуленчука	Строительная готовность - 39 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
13	Детский сад в Ленинском районе, ул. Руднева	Строительная готовность - 55 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
14	Школа в Ленинском р-не пр-т Генерала Острякова - ул. Хрусталева - 5-й км	Строительная готовность - 53 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
15	Строительство клуба 1-е отделение Золотой Балки	Строительная готовность - 70 %. Ввод в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
16	Строительство многофункционального культурно-досугового центра, бухта Казачья	Строительная готовность - 92 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
17	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бокса по ул. Вакуленчука	Строительная готовность - 54 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.
18	Строительство пожарного депо в с. Павловка на 4 пожарных выезда	Строительная готовность - 69 %. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.

8.2. В ходе проведения мониторинга и анализа исполнения мероприятий Программы за первое полугодие 2024 года проведена качественная оценка рисков реализации Программы в рамках критерия «Строительная готовность объекта» (объекты 2024 года) по 17 объектам в целях оценки вероятности реализации риска (с применением балльной оценки)¹⁴ и оценки влияния рисков на цели и результаты (с применением балльной оценки).

Справочно: для оценки использованы Методические рекомендации по оценке рисков при проведении стратегического аудита и аудита эффективности, утвержденные Коллегией Счетной палаты Российской Федерации протокол от 19.07.2022 №49К (1574).

Оценка влияния реализации риска составляет: 1 балл «Очень низкая» по одному объекту, 2 балла «Низкая оценка» по одному объекту, 4 балла «Высокая оценка» по одному объекту, 5 баллов «Очень высокая» по 14 объектам.

Оценка вероятности реализации риска составляет: 1 балл «Очень низкая» по одному объекту, 2 балла «Низкая оценка» по двум объектам, 3 балла «Средняя

¹⁴ Пятибалльная шкала



оценка» по 9 объектам, 4 балла «Высокая оценка» по трем объектам, 5 баллов «Очень высокая» по двум объектам.

Результаты предварительной оценки вероятности реализации рисков и влияния на цели и запланированные результаты (ввод объектов в эксплуатацию в 2024 году) по состоянию на 01.07.2024 приведены в таблице № 5.

Таблица №5

№ п/п	Наименование объекта	Уровень строительной готовности	Вероятность риска (PQ)	Влияние риска (MQ)	Рейтинг риска (RR=PQ*MQ)	Значимость риска
1	2	3	4	5	6	7
1	Газификация сел Байдарской долины, село Озерное (низкое давление)	99%	1	1	1	Умеренный
2	Строительство многофункционального культурно-досугового центра, бухта Казачья	92%	2	2	4	Умеренный
3	Газификация сел Фруктовое и Поворотное	80%	2	4	8	Существенный
4	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 3-я очередь	76%	3	5	15	Критический
5	Строительство клуба 1-е отделение Золотой Балки	70%	3	5	15	Критический
6	Строительство пожарного депо в с. Павловка на 4 пожарных выезда	69%	3	5	15	Критический
7	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 64 Н-150 ул. Древняя	65%	3	5	15	Критический
8	Строительство подстанции №1 ГБУЗС "Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", пр-т Победы	64%	3	5	15	Критический
9	Детский сад в Ленинском районе, ул. Руднева	55%	3	5	15	Критический
10	Газификация с. Верхнесадовое (низкое давление)	55%	3	5	15	Критический
11	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бокса по ул. Вакулечука	54%	3	5	15	Критический
12	Школа в Ленинском р-не пр-т Генерала Острякова - ул. Хрусталева - 5-й км	53%	3	5	15	Критический
13	Детский сад в Гагаринском районе, ул. Вакулечука	39%	4	5	20	Критический
14	Газификация села Пироговка (низкое давление)	29%	4	5	20	Критический
15	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 2-я очередь	20%	4	5	20	Критический
16	Строительство транспортной связи автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-209 "Столетовский проспект" и автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-222 "ул. Тараса Шевченко" с устройством транспортной развязки в одном уровне и реконструкцией участка автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-222 "ул. Тараса Шевченко"	17%	5	5	25	Критический
17	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Большая Морская, 24	0%	5	5	25	Критический



Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что по двум объектам из 17-ти анализируемых значимость риска умеренная, по одному объекту – существенная, по 14-ти объектам – критический уровень риска несвоевременного ввода в эксплуатацию объектов в 2024 году.

Таким образом, по 14-ти объектам, запланированным к вводу в 2024 году, существуют факторы, которые напрямую не находятся в зоне влияния ГРБС и позволяют отнести их к неуправляемым рискам.

Выводы

1. С целью реализации государственной политики регионального развития по сокращению различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности, сокращению различий в уровне социально-экономического развития регионов, достижению необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации на период 2022 - 2026 гг. в Программе утверждены предельные объемы финансирования для города Севастополя в сумме 116 735,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 110 616,8 млн рублей (или 94,8%), средств бюджета города Севастополя – 6 118,3 млн рублей (или 5,2%).

2. На 2024 год Правительство Севастополя с Минстроем России заключило 9 соглашений.

3. Согласно адресному распределению субсидий объемы финансирования реализации мероприятий Программы по городу Севастополю в 2024 году составили 19 261,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18 298,6 млн рублей (или 95%), что соответствует объемам финансирования, утвержденным в СБР по состоянию на 01.07.2024.

4. По состоянию на 01.07.2024 в нормативный правовой акт города Севастополя по распределению средств Субсидии в рамках Программы по главным распорядителям бюджетных средств в части утвержденных объемов ресурсного обеспечения, корректировки, связанные с изменениями финансового обеспечения согласно дополнительным соглашениям, не внесены.

5. В 2024 году Правительство Севастополя с Минстроем России заключило 6 дополнительных соглашений, согласно которым в бюджет города Севастополя осуществлен возврат не использованных в 2022-2023 гг. средств Субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» в объеме 46,3 млн рублей.

6. Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий Программы утверждено в 13 государственных программ города Севастополя.



7. В первом полугодии 2024 года в объемы финансирования мероприятий Программы внесены изменения согласно заключенным дополнительным соглашениям о предоставлении средств субсидии по разделу «Капитальные вложения». Объем финансирования уменьшен на 4 956,4 млн рублей (или на 25,7 %). По разделу «Прочие нужды» корректировки объемов финансирования не производились.

8. По состоянию на 01.07.2024 федеральные средства и средства бюджета города Севастополя, направленные на реализацию мероприятий государственных программ города Севастополя в рамках Программы, исполнены в объеме 6 541,2 млн рублей или 33,9 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на реализацию вышеуказанных мероприятий в сводной бюджетной росписи (19 308,0 млн рублей) или 45,6% от финансирования по допсоглашениям (14 351,6 млн рублей).

9. Согласно соглашениям, заключенным с Минстроем России на 2024 год и с учетом изменений в них, предусмотрено ввести в эксплуатацию 18 объектов.

В первом полугодии 2024 года введено в эксплуатацию 5 объектов, из которых 1 объект 2024 года (сдан досрочно) и 4 переходящих объекта с 2023 года.

10. Согласно проведенной предварительной оценке вероятности реализации рисков и влияния на цели и запланированные результаты (ввод объектов в эксплуатацию в 2024 году) установлено, что по 14-ти объектам, запланированным к вводу в 2024 году, существуют факторы, которые напрямую не находятся в зоне влияния ГРБС и позволяют отнести их к неуправляемым рискам.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Севастополя



Ю.В. КОКАРЕВА



Приложение № 1

Информация об объектах, мероприятиях, предусмотренных в соглашениях на 2024 год, об объемах финансирования согласно соглашениям по состоянию на 01.07.2024 в разрезе видов работ и сроках реализации объектов и мероприятий

Наименование государственной программы города Севастополя							
№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества							
<i>Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя</i>							
Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024 -002/2 от «11» апреля 2024 года							
1	Газификация с. Верхнесадовое (низкое давление)	СМР	141,6	134,5	0,00	0,00	2024
2	Газопровод высокого давления (1,2 МПа) от ГРС-3 до ГРП на Северной стороне, среднего давления от ГРП до ГРП-6а с переходом Севастопольской бухты	СМР	339,3	322,4	0,00	0,00	2025
3	Строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья	СМР	500,0	475,0	0,00	0,00	2025
4	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 2-я очередь	СМР	10,0	9,5	0,00	0,00	2024
5	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 3-я очередь	СМР	26,0	24,7	0,00	0,00	2024
6	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 4-я очередь	ПИР	7,9	7,6	0,00	0,00	2025
		СМР	155,6	147,8	0,00	0,00	
7	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 5-я очередь	ПИР	8,8	8,4	0,00	0,00	2025
8	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 6-я очередь	ПИР	11,6	11,0	0,00	0,00	2025

Наименование государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
		СМР	100,0	95,0	0,00	0,00	
9	Газификация села Пироговка (низкое давление)	СМР	31,4	29,9	0,00	0,00	2024
10	Газификация сел Фруктовое и Поворотное	СМР	5,0	4,8	0,00	0,00	2024
11	Газификация сел Байдарской долины, село Передовое (низкое давление)	СМР	37,5	35,6	0,00	0,00	2025
12	Газификация сел Байдарской долины, село Подгорное (низкое давление)	СМР	20,5	19,5	0,00	0,00	2025
13	Газификация сел Байдарской долины, село Родниковое (низкое давление)	СМР	20,8	19,7	0,00	0,00	2025
14	Газификация сел Байдарской долины, село Россошанка (низкое давление)	СМР	16,4	15,5	0,00	0,00	2025
15	Газификация сел Байдарской долины, село Озерное (низкое давление)	СМР	20,2	19,2	0,00	0,00	2024
Всего			1 452,6	1 379,9	0,00	0,00	х
Мероприятия по обеспечению водоотведения							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024 -002/2 от «11» апреля 2024 года							
16	Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные"	СМР	222,3	211,2	0,00	0,00	2026
17	Строительство канализационного коллектора г. Севастополь, Балаклавский район	СМР	2 013,2	1 912,6	0,00	0,00	2025
Всего			2 235,5	2 123,8			

Наименование государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия по обеспечению водоснабжения							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024 -002/2 от «11» апреля 2024 года							
18	Строительство сетей водопровода мыс Фиолент	ПИР	20,7	19,6	0,00	0,00	2025
19	Реконструкция водовода ВУ-7-ВУ- 20, Ду-500 мм	СМР	240,0	228,0	0,00	0,00	2025
20	Реконструкция с увеличением диаметра водовода от ГУ-3 до Ялтинского кольца, Ду-400 мм	СМР	120,8	114,8	0,00	0,00	2025
Всего			381,45	362,4	0,0	0,0	
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024 -002/2 от «11» апреля 2024 года							
21	Реконструкция центрального теплового пункта N 10 с переводом в квартальную котельную (от котельной по ул. Хрусталева, 66-а)	СМР	24,4	23,2	0,00	0,00	2025
22	Реконструкция квартальной котельной по ул. Костромская, 14/1	СМР	21,0	20,0	0,00	0,00	2025
23	Реконструкция квартальной котельной по ул. Ракетная, 10	СМР	24,2	23,0	0,00	0,00	2025
24	Реконструкция котельной по ул. Строительная, 49	СМР	23,1	22,0	0,00	0,00	2025
25	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Большая Морская, 24	СМР	1,4	1,4	4,33	4,11	2024

Наименование государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-ГРЭС Севастопольской ТЭЦ на новую БМК	СМР	14,7	13,9	0,00	0,00	2025
27	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-72,73,74 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Механизаторов 11а	СМР	41,2	39,2	0,00	0,00	2025
28	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-71 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Жидилова, 30	СМР	57,8	54,9	0,00	0,00	2025
29	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-70 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Мельника 9а	СМР	56,4	53,5	0,00	0,00	2025
30	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-69 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы 23а	СМР	62,1	59,0	0,00	0,00	2025
31	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-68 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы 13	СМР	18,9	18,0	0,00	0,00	2025
32	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-66 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы 66а	СМР	1,8	1,7	0,00	0,00	2025
33	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-64 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы 6а	СМР	95,1	90,3	0,00	0,00	2025
34	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-63 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Менжинского 5	СМР	112,2	106,6	0,00	0,00	2025
35	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-60, 75 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Паршина 2а	СМР	73,6	70,0	0,00	0,00	2025
36	Перевод тепловой нагрузки мкрна Георгиевская балка с Севастопольской ТЭЦ на новую БМК	СМР	4,7	4,5	0,00	0,00	2025
Всего			632,7	601,1	4,3	4,11	х
Итого по ГП			4 702,2	4 467,1	4,3	4,11	
<i>Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя</i>							
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог города Севастополя							

Наименование государственной программы города Севастополя							
№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнительное соглашение № 069-09-2024-392/2 от «11» апреля 2024 года						
37	Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 "Севастополь - порт Камышовая бухта" и 67 Н261 "пр-т Генерала Острякова - ул. Хрусталева (5 км Балаклавского шоссе)	СМР	965,4	917,2	0,00	0,00	2026
38	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта - Севастополь, 8 этап	СМР	50,0	47,5	0,00	0,00	2024
39	Реконструкция ул. Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию "Парка Музейно-мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 гг" на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе	СМР	321,4	305,3	0,00	0,00	2025
40	Строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги 67 Н-256 ул. Г. Петрова, на участке от ул. Очаковцев до ул. Пожарова в рамках обеспечения транспортной доступности Парка Музейно-мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 гг" на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе	ПИР	126,0	119,7	0,00	0,00	2025
		СМР	1374,0	1305,3	0,00	0,00	
41	Строительство транспортной связи дороги 67 ОП МЗ 67 Н-209 Столетовский проспект и автомобильной дороги 67 ОП ул. Тараса Шевченко с устройством транспортной развязки в одном уровне и реконструкцией участка автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-222 ул. Тараса Шевченко	СМР	369,3	350,9	0,00	0,00	2024
42	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 64 Н-150 ул. Древняя	СМР	482,4	458,3	0,00	0,00	2024
43	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 "Севастополь - порт Камышовая Бухта" на км 4	СМР	0,00	0,00	4,09	3,89	2023
44	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 "Севастополь - порт Камышовая Бухта" на км 6	СМР	0,00	0,00	7,37	7,00	2023
45	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 "Севастополь - порт Камышовая Бухта" на км 7	СМР	0,00	0,00	13,60	12,92	2023
Всего			3 688,5	3 504,1	25,1	23,8	x

Наименование государственной программы города Севастополя							
№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия по развитию портовой и аэропортовой инфраструктуры							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-392/2 от «11» апреля 2024 года							
46	Реконструкция пассажирского пирса №10 на Северной стороне	ПИР	45,1	42,9	0,00	0,00	2027
47	Реконструкция пассажирского катерного пирса N 147 у Графской пристани	ПИР	54,8	52,1	0,00	0,00	2027
48	Реконструкция пассажирского причала N 49 в Большом Инкермане	ПИР	55,1	52,3	0,00	0,00	2027
49	Реконструкция пассажирского причала в бухте Матюшенко в микрорайоне "Радиогорка"	ПИР	41,7	39,6	0,00	0,00	2027
Всего			196,7	186,8	0,0	0,0	
Итого по ГП			3 885,19	3 690,92	25,06	23,81	
Развитие здравоохранения в городе Севастополе							
Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-393/3 от «26» апреля 2024 года							
50	Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера,	СМР	636,7	604,9	0,00	0,00	2026
51	Строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену на Корабельной стороне	СМР	80,0	76,0	0,00	0,00	2026

Наименование государственной программы города Севастополя							
№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Севастопольская больница скорой медицинской помощи	СМР	349,9	332,4	0,00	0,00	2025
53	Строительство подстанции №1 ГБУЗ "Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", пр-т Победы	СМР	32,7	31,0	0,00	0,00	2024
Итого по ГП			1 099,3	1 044,3	0,0	0,0	х
<i>Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе</i>							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-393/3 от «26» апреля 2024 года							
54	Строительство психоневрологического интерната, в том числе проектно-изыскательские работы	СМР	461,2	438,2	0,00	0,00	2025
Итого по ГП			461,2	438,2	0,0	0,0	х
<i>Развитие образования в городе Севастополе</i>							
Модернизация дошкольного образования							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-389/2 от «11» апреля 2024 года							
55	Детский сад в Гагаринском районе, ул. Вакуленчука	СМР	9,6	9,1	15,54	14,76	2024
56	Детский сад в Ленинском районе, ул. Руднева	СМР	26,7	25,4	0,00	0,00	2024
57	Строительство детского сада в Балаклавском районе на 270 мест	ПИР	12,0	11,4	0,20	0,19	2025
		СМР	100,0	95,0	0,00	0,00	
Всего			148,2	140,8	15,7	15,0	х

Наименование государственной программы города Севастополя							
№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
Модернизация общего образования							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-389/2 от «11» апреля 2024 года							
58	Строительство школы в микрорайоне Радиогорка	СМР	57,7	54,8	0,0	0,0	2025
59	Школа в Ленинском р-не пр-т Генерала Острякова - ул. Хрусталева - 5-й км	СМР	50,0	47,5	0,0	0,0	2024
Всего			107,7	102,3	0,0	0,0	х
Итого по ГП			256,0	243,2	15,7	15,0	
Развитие туризма города Севастополя							
Мероприятия по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур"							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-395/3 от «26» апреля 2024 года							
60	Создание парка с мемориальным комплексом "Защитникам Севастополя 1941 - 1942 гг.	ПИР	71,3	67,7	0,0	0,0	2027
61	Реконструкция и благоустройство парка Победы, г. Севастополь (2-я очередь)	СМР	150,3	142,8	0,0	0,0	2025
Итого по ГП			221,6	210,5	0,0	0,0	х
Развитие культуры города Севастополя							

Наименование государственной программы города Севастополя							
№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия по развитию объектов культуры							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-379/1 от «15» марта 2024 года							
62	Строительство клуба 1-е отделение Золотой Балки	СМР	87,8	83,4	0,0	0,0	2024
63	Строительство многофункционального культурно-досугового центра, бухта Казачья	СМР	338,4	321,5	0,0	0,0	2024
Итого по ГП			426,2	404,9	0,0	0,0	х
<i>Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе</i>							
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-379/1 от «15» марта 2024 года							
64	Строительство крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения ул. Генерала Мельника и Лабораторного шоссе	СМР	70,0	66,5	0,0	0,0	2025
65	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бокса по ул. Вакулечука	СМР	101,9	96,8	0,0	0,0	2024
Итого по ГП			171,9	163,3	0,0	0,0	х
<i>Развитие информационного общества в городе Севастополе</i>							
Строительство антенно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования							

Наименование государственной программы города Севастополя							
№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Строительство антенно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования	СМР	0,00	0,00	0,11	0,11	2023
Итого по ГП			0,00	0,00	0,113	0,107	0,0
<i>Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя</i>							
Мероприятия по ветеринарному и фитосанитарному надзору							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-391/1 от «12» апреля 2024 года							
67	Строительство ветеринарной лечебницы (инфекционно-диагностической лаборатории) в г. Севастополе, в районе ул. Озерная	СМР	140,6	133,6	1,13	1,07	2025
68	Строительство площадки для размещения специальной печи (крематора- инсинератора)	ПИР	6,4	6,1	0,0	0,0	2025
		СМР	3,2	3,0	0,0	0,0	
Итого по ГП			150,2	142,7	1,1	1,1	х
<i>Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе</i>							
Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах							
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-390 от «26» декабря 2024 года							
69	Строительство пожарного депо в с. Павловка на 4 пожарных выезда	СМР	192,0	182,4	0,00	0,00	2024
Итого по ГП			192,0	182,4	0,0	0,0	х
<i>Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе</i>							

Наименование государственной программы города Севастополя							
№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительное соглашение № 069-09-2024-395/3 от «26» апреля 2024 года							
70	Создание индустриального парка в г. Севастополе	СМР	50,1	47,6	0,00	0,00	2025
71	Создание яхтенной марины, г. Севастополь	СМР	1 978,2	1 879,3	0,00	0,00	2025
Итого по ГП			2 028,2	1 926,8	0,0	0,0	х
Итого на капитальные вложения			13 594,0	12 914,3	46,4	44,1	х
Итого объектов		71					
Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), финансируемых из федерального бюджета ("Прочие нужды")							
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя							
Соглашение № 069-09-2024-404 от «26» декабря 2023 года							
1	Реализация плана мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения г. Севастополь	мероприятие	354,0	336,6	0,00	0,00	2024
Итого по ГП			354,0	336,6	0,0	0,0	
Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе							
Соглашение № 069-09-2024-404 от «26» декабря 2023 года							

Наименование государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование объектов, мероприятий, предусмотренных в соглашениях на 2024 - 2027 годы	Направление инвестирования	Объемы финансирования согласно соглашениям на 01.07.2024	за счет средств федерального бюджета	в том числе возврат средств субсидий прошлых лет		Год ввода в эксплуатацию
					2022,2023 гг.	за счет средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Мероприятия по координации, управлению и контролю реализации инвестиционных проектов государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	мероприятие	357,3	294,2	0,00	0,00	2027
Итого по ГП			357,3	294,2	0,0	0,0	x
Итого прочие нужды на 2024 год			711,3	630,8	0,0	0,0	
Итого			14 305,3	13 545,0	46,3	44,1	
Итого с учетом возврата средств субсидии за 2023 год			14 351,6	13 589,1			

Информация о государственных контрактах, заключенных в рамках реализации объектов и мероприятий ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», сроках начала и завершения реализации объектов и мероприятий, кассовом исполнении по состоянию на 01.07.2024

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя, наименование объектов, мероприятий в рамках ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	Вид работ	Начало реализации	Завершение реализации	Государственные контракты (№, дата)	Объемы финансирования, предусмотренные в 2024 году, согласно соглашениям на 01.07.2024	Кассовое исполнение в 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя						5 060,6	2 156,0
Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы						1 452,6	259,9
1	Газификация с. Верхнесадовое (низкое давление)	СМР	дек.23	дек.24	32-СК/Б/2022 от 04.10.2022	141,6	38,7
2	Газопровод высокого давления (1,2 МПа) от ГРС-3 до ГГРП на Северной стороне, среднего давления от ГГРП до ГГРП-6а с переходом Севастопольской бухты	СМР	фев.23	дек.25	000000113921РСМ0007420017/5-СМР/2022 от 14.12.2022	339,3	66,8
3	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 2-я очередь	СМР	сен.22	дек.24	№ 29204007681220000460/2-СМР/2022 от 23.06.2022	10,0	0,6
4	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 3-я очередь	СМР	сен.23	дек.24	№ 29204007681220000480/3-СМР/2022 от 23.06.2022	26,0	11,5
5	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 4-я очередь	ПИР	ноя.17	ноя.23	-	7,9	0,0
		СМР	дек.23	дек.25	-	155,6	0,0
6	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 5-я очередь	ПИР	дек.17	ноя.22	-	8,8	0,0
		СМР	мар.23	сен.25	-	0,0	0,0
7	Газификация сел Байдарской долины ЮБК, 6-я очередь	ПИР	апр.18	ноя.23	-	11,6	0,0
		СМР	дек.23	сен.25	-	100,0	0,0
8	Газификация сел Фруктовое и Поворотное	СМР	июн.23	дек.24	002000106922РУЮ0007420017/1-СМР/2023 от 16.05.2023	5,0	0,7

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя, наименование объектов, мероприятий в рамках ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	Вид работ	Начало реализации	Завершение реализации	Государственные контракты (№, дата)	Объемы финансирования, предусмотренные в 2024 году, согласно соглашениям на 01.07.2024	Кассовое исполнение в 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Газификация села Пироговка (низкое давление)	СМР	дек.23	дек.24	8-СМР/2023 /009016706922РУJ0007420017 от 11.12.2023	31,4	29,9
10	Строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, г. Севастополь	СМР	июн.17	дек.25	№1-ПСР/2021 от 12.03.2021; 34-СК/Б/2022 от 04.10.2022	500,0	0,0
11	Газификация сел Байдарской долины, село Передовое (низкое давление)	СМР	мар.24	дек.25	№ 13СМР/2023/0090100 06922РУJ00074200 17 от 25.12.2023	37,5	35,6
12	Газификация сел Байдарской долины, село Подгорное (низкое давление)	СМР	фев.24	дек.25	№ 12СМР/2023/0090191 06922РУJ00074200 17 от 25.12.2023	20,5	20,1
13	Газификация сел Байдарской долины, село Родниковое (низкое давление)	СМР	фев.24	дек.25	№ 14СМР/2023/0090189 06922РУJ00074200 17 от 25.12.2023	20,8	20,3
14	Газификация сел Байдарской долины, село Россошанка (низкое давление)	СМР	мар.24	дек.25	№ 9-СМР/2023 / 009018706922РУJ0 007420017 от 21.12.2023	16,4	15,5
15	Газификация сел Байдарской долины, село Озерное (низкое давление)	СМР	ноя.23	дек.25	№ 009009806922РУJ0 007420017/4СМР/2023 от 14.08.2023	20,3	20,2
Мероприятия по обеспечению водоотведения						2235,5	951,9
16	Строительство канализационного коллектора г. Севастополь, Балаклавский район	ПИР	дек.22	окт.23	002000106922РУK0007420017/1- ПСР/2022 от 05.12.2022	0,0	951,9
		СМР	июн.24	дек.25		2013,2	
17	Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные"	СМР	январ.18	дек.26	29204007681200000450/4-СМР/2020 07.09.2020	222,3	0,0
Мероприятия по обеспечению водоснабжения						381,5	7,6
18	Реконструкция с увеличением диаметра водовода от ГУ-3 до "Ялтинского кольца" Ду-400 мм	ПИР	окт.18	дек.22	-	0,0	0,0
		СМР	дек.23	дек.25	-	120,8	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя, наименование объектов, мероприятий в рамках ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	Вид работ	Начало реализации	Завершение реализации	Государственные контракты (№, дата)	Объемы финансирования, предусмотренные в 2024 году, согласно соглашениям на 01.07.2024	Кассовое исполнение в 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Строительство сетей водопровода мыс Фиолент	ПИР	фев.23	дек.23	009020906922РУК0007420017/5-ПИР/2023 от 21.09.2023	20,7	7,6
		СМР	мар.24	дек.25	-	0,0	0,0
20	Реконструкция водовода ВУ-7-ВУ-20, Ду-500мм	СМР	с ен19	дек25	-	240,0	0,0
<i>Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, развитию теплоэнергетики</i>						637,0	582,6
21	Реконструкция центрального теплового пункта № 10 с переводом в квартальную котельную (от котельной по ул. Хрусталева, 66-а)		дек.22	сен25	009009113921PCO0007420017/9-СМР/2022 от 22.12.2022	24,4	0,0
22	Реконструкция квартальной котельной по ул. Костромская, 14/1	СМР	мар.23	дек25	№ 10-СМР/2023 / 009014606922РУК0007420017 от 21.12.2023	21,0	20,5
23	Реконструкция квартальной котельной по ул. Ракетная, 10	СМР	мар.23	дек.25	№ 11-СМР/2023 / 009014706922РУК0007420027 от 21.12.2023	24,2	23,6
24	Реконструкция котельной по ул. Строительная, 49	СМР	мар.23	дек25	-	23,1	0,0
25	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Большая Морская, 24	СМР	май.23	дек24	29204007681210000290/3-СМР/2021 01.06.2021	5,8	0,0
26	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-ГРЭС Севастопольской ТЭЦ на новую БМК	СМР	дек.23	окт.25	№2223-00795 от 22.11.2023, №25023-2668 от 22.11.2023, №21/8-23996 от 24.11.2023-	14,7	14,7
27	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-72,73,74 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Механизаторов 11а	СМР	дек.23	окт25	№2223-00796 от 22.11.2023, №21/8-24001/К, №21/8-24001/В от 24.11.2023	41,2	41,2
28	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-71 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Жидилова, 30	СМР	дек.23	окт25	№2223-00794 от 22.11.2023, №21/8-24003/К; №21/8-24003/В от 24.11.2023;	57,8	57,8

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя, наименование объектов, мероприятий в рамках ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	Вид работ	Начало реализации	Завершение реализации	Государственные контракты (№, дата)	Объемы финансирования, предусмотренные в 2024 году, согласно соглашениям на 01.07.2024	Кассовое исполнение в 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-70 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Мельника 9а	СМР	дек.23	окт25	№2223-00791 от 22.11.2023, №25023-2692 от 07.12.2023, №21/8-008/К №21/8-24008/В от 24.11.2023;	56,4	56,4
30	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-69 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы 23а	СМР	дек.23	окт25	№2223-00793 от 22.11.2023, №25023-2688 от 07.12.2023, №21/8-24011/К №21/8-24011/В от 24.11.2023;	62,1	62,1
31	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-68 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы 13	СМР	дек.23	окт25	№2223-00787 от 22.11.2023, №21/8-23999/К №21/8-23999/В от 24.11.2023;	18,9	18,9
32	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-66 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы 6ба	СМР	дек.23	окт25	№2223-00789 от 22.11.2023, №25023-2690 от 22.11.2023, №21/8-23997/К №21/8-23997/В от 24.11.2023;	1,8	1,8
33	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-64 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы 6а	СМР	дек.23	окт25	№2223-00797 от 22.11.2023, №25023-2672 от 22.11.2023, №21/8-24005/К №21/8-24005/В от 24.11.2023;	95,1	95,1
34	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-63 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Менжинского 5	СМР	дек.23	окт25	№2223-00792 от 22.11.2023, №25023-2671 от 22.11.2023, №21/8-24002/К №21/8-24002/В от 24.11.2023;	112,2	112,2
35	Перевод тепловой нагрузки ЦТП-60, 75 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Паршина 2а	СМР	дек.23	окт25	№2223-00790 от 22.11.2023, №25023-2670 от 22.11.2023, №21/8-23898/К №21/8-23898/В от 24.11.2023;	73,6	73,6
36	Перевод тепловой нагрузки мкрна Георгиевская балка с Севастопольской ТЭЦ на новую БМК	СМР	дек.23	окт25	№2223-00788 от 22.11.2023, №25023-2662 от 22.11.2023, №21/8-23995 от 24.11.2023	4,7	4,7
<i>Реализация плана мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения г. Севастополь</i>						354,0	354,0
37	Мероприятия по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов: «Реализация плана мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения г. Севастополь»	ремонт	апр.22	дек24	Контракт от 06.07.2023 №210 Контракт от 14.12.2023 №:613 Контракт от 15.12.2023 №:612	354	354,00
<i>Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя</i>						3910,2	930,3
<i>Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог города Севастополя</i>							

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя, наименование объектов, мероприятий в рамках ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	Вид работ	Начало реализации	Завершение реализации	Государственные контракты (№, дата)	Объемы финансирования, предусмотренные в 2024 году, согласно соглашениям на 01.07.2024	Кассовое исполнение в 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 "Севастополь - порт Камышовая бухта" и 67 Н261 "пр-т Генерала Острякова - ул. Хрусталева (5 км Балаклавского шоссе)	СМР	апр.22	дек26	№ 42-ЕП-2021 от 25.11.2021	965,4	286,5
39	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта - Севастополь, 8 этап	СМР	авг.20	дек.24	17/20 СМР 06.11.2020	50,0	21,0
40	Реконструкция ул. Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию «Парка Музейно-мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 гг" на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе	СМР	авг.22	дек25	№ 43-ЕП-2022 от 25.08.2022	321,4	213,4
41	Строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги 67 Н-256 ул. Генерала Петрова, на участке от ул. Очаковцев до ул. Пожарова, в рамках обеспечения транспортной доступности "Парка Музейно-мемориального комплекса "Защитникам Севастополя - 1941 - 1942 гг." на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе	ПИР	мар.23	окт.23	№ 20-ЕП-2023 от 24.04.2023	126,0	0,0
		СМР	дек.23	дек25	-	1374,0	0,0
42	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 "Севастополь - порт Камышовая Бухта" на км 4	СМР	сен.22	дек.23	№ 78-ЕП-2022 от 15.12.2022	4,1	0,0
43	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 "Севастополь - порт Камышовая Бухта" на км 6	СМР	сен.22	дек.23	№ 79-ЕП-2022 от 15.12.2022	7,4	0,0
44	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 "Севастополь - порт Камышовая Бухта" на км 7	СМР	сен.22	дек.23	№ 80-ЕП-2022 от 16.12.2022	13,6	4,3
45	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 64 Н-150 ул. Древняя	СМР	мар.24	дек.24	№ 1-ЕП-2024 от 17.01.2024; № 23ЕП-2024 от 27.02.2024; № 11ЕП-2024 от 01.02.2024	482,4	274,5
46	Строительство транспортной связи дороги 67 ОП МЗ 67 Н-209 Столетовский проспект и автомобильной дороги 67 ОП ул. Тараса Шевченко с устройством транспортной развязки в одном уровне и реконструкцией участка автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-222 ул. Тараса Шевченко	СМР	сен.23	дек.24	от 29.09.2023 № 70- ЕП-2023	369,3	44,7
Мероприятия по развитию портовой и аэропортовой инфраструктуры							
47	Реконструкция пассажирского пирса N 10 на Северной стороне	ПИР	окт.23	дек.24	№ 72-ЕП-2023 от 11.10.2023	45,1	20,1
		СМР	мар.26	дек.27	-		
48	Реконструкция пассажирского катерного пирса N 147 у Графской пристани	ПИР	окт.23	дек.24	№ 74-ЕП-2023 от 27.10.2023	54,8	24,9
		СМР	мар.26	дек.27	-		

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя, наименование объектов, мероприятий в рамках ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	Вид работ	Начало реализации	Завершение реализации	Государственные контракты (№, дата)	Объемы финансирования, предусмотренные в 2024 году, согласно соглашениям на 01.07.2024	Кассовое исполнение в 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Реконструкция пассажирского причала N 49 в Большом Инкермане	ПИР	окт.23	дек.24	№ 71-ЕП-2023 от 11.10.2023	55,1	25,0
		СМР	мар.26	дек.27	-		
50	Реконструкция пассажирского причала в бухте Матюшенко в микрорайоне "Радиогорка"	ПИР	окт.23	дек.24	№ 73-ЕП-2023 от 27.10.2023	41,7	18,3
		СМР	мар.26	дек.27	-		
Развитие здравоохранения в городе Севастополе						1099,3	748,2
<i>Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения</i>							
51	Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь	СМР	сен.21	дек.26	29204007681200001030/5-СМР/2020 17.12.2020	636,7	617,2
52	Строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену на Корабельной стороне	СМР	мар.22	дек.25	№ 29204007681210001600/18-СМР/2021 от 28.12.2021	80,0	0,0
53	Севастопольская больница скорой медицинской помощи	СМР	июл.20	дек.26	29204007681200000220/2-СМР/2020 15.06.2020	349,9	99,7
54	Строительство подстанции №1 ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», пр-т Победы (в 2019 году не включен в соглашение. СМР по объекту предусмотрены в соглашении 2020 года, начало строительства - 2021 год)	СМР	фев.21	дек.24	29204007681200000590/18-СМР/2020 06.11.2020	32,7	31,3
Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе						461,2	436,8
<i>Мероприятия, направленные на обеспечение объектами социального назначения</i>							
55	Строительство психоневрологического интерната, в том числе проектно-исследовательские работы	СМР	сен.21	дек.25	№ 29204007681200000820/29-СМР/2020 от 24.11.2020	461,2	436,8
Развитие образования в городе Севастополе						271,7	51,0
<i>Модернизация дошкольного образования</i>							
56	Детский сад в Гагаринском районе, ул. Вакулечука	СМР	фев.23	дек.24	009021013921РСМ0007420017/7-СМР/2022 от 18.12.2022	25,1	1,7

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя, наименование объектов, мероприятий в рамках ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	Вид работ	Начало реализации	Завершение реализации	Государственные контракты (№, дата)	Объемы финансирования, предусмотренные в 2024 году, согласно соглашениям на 01.07.2024	Кассовое исполнение в 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Детский сад в Ленинском р-не, ул. Руднева	СМР	мар.23	дек.24	009002213921РСМ0007420017/6-СМР/2022 от 19.12.2022	26,7	0,4
58	Строительство детского сада в Балаклавском районе	ПИР	ноя.17	дек.23	009003313921РСМ0007420017/4-ПИР/2022 от 21.12.2022	12,2	0,0
		СМР	апр.24	дек.25	-	100,0	0,0
Модернизация общего образования						107,7	48,9
59	Строительство школы в микрорайоне Радиогорка	СМР	авг.18	дек.25	29204007681200000980/20-СМР/2020 10.12.2020	57,7	0,0
60	Школа в Ленинском р-не Ген.Острякова-Хрусталёва-5 км	СМР	дек.20	дек.24	29204007681200000660/23-СМР/2020 13.11.2020	50,0	48,9
Развитие туризма города Севастополя						221,6	10,6
<i>Мероприятия по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур"</i>							
61	Реконструкция и благоустройство парка Победы, г. Севастополь (2-я очередь)	СМР	дек.21	дек.25	№ 29204007681200001690/3-ПСП/2020 22.12.2020	150,3	0,0
62	Создание парка с мемориальным комплексом "Защитникам Севастополя 1941 - 1942 гг.	ПИР	дек.22	дек.23	№9-ПИР/2023 от 11.12.2023	71,3	10,6
		СМР	фев.26	дек.27	-	0,0	0,0
Развитие культуры города Севастополя						426,2	179,8
<i>Мероприятия по развитию объектов культуры</i>							
63	Строительство клуба 1-е отделение Золотой Балки	СМР	сен.22	дек.24	№3-СМР/2023 от 18.08.2023	87,8	15,5
64	Строительство многофункционального культурно-досугового центра, бухта Казачья	СМР	мар.22	дек.24	№ 29204007681210001560/15-СМР/2021 от 24.12.2021	338,4	164,3
Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе						171,9	110,0
<i>Мероприятия по развитию физической культуры и спорта</i>							
65	Строительство крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения Генерала Мельника и Лабораторное шоссе	СМР	окт.20	дек.25	29204007681200000370/3-СМР/2020 31.07.2020	70,00	59,0
66	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бокса по ул. Вакуленчука	СМР	фев.23	дек.24	009017713921РСМ0007420017/8-СМР/2022 от 19.12.2022	101,90	50,95
Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе						192,0	26,7

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя, наименование объектов, мероприятий в рамках ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	Вид работ	Начало реализации	Завершение реализации	Государственные контракты (№, дата)	Объемы финансирования, предусмотренные в 2024 году, согласно соглашениям на 01.07.2024	Кассовое исполнение в 2024 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе</i>							
67	Строительство пожарного депо в с. Павловка на 4 пожарных выезда	СМР	дек.20	дек.24	29204007681200000760/14-СМР/2020 20.11.2020	192,0	26,7
<i>Развитие информационного общества города Севастополя</i>						0,1	0,0
<i>Мероприятия по развитию комплекса связи и массовых коммуникаций</i>							
68	Строительство антенно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования	СМР	дек.21	дек.24	№ 29204007681210001520/11-ПСР/2021 от 24.12.2021	0,1	0,0
<i>Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе</i>						2385,5	1892,7
<i>Создание индустриального парка в городе Севастополе</i>							
69	Создание индустриального парка в г. Севастополе	СМР	мар.21	сен.25	29204007681200000900/22-СМР/2020 02.12.2020	50,1	0,0
<i>Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров</i>							
<i>Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань"</i>						1978,2	1762,3
70	Создание яхтенной марины, г. Севастополь	СМР	мар.22	дек.25	№ 29204007681210001290/9-СМР/2021 от 16.12.2021	1978,2	1762,3
<i>Мероприятия по координации, управлению и контролю реализации инвестиционных проектов государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»</i>						357,3	130,4
71	Мероприятия, реализуемые на территории г. Севастополя	Прочие работы	мар.18	дек.27	№ 126-ПП от 22.02.2018, соглашение ДТРДИ от 10.01.2018 №1-С/18, соглашение от 23.01.2019 №1-С	357,3	130,4
<i>Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя</i>						151,3	0,0
<i>Ветеринарный и фитосанитарный надзор в г. Севастополе</i>							
72	Строительство ветеринарной лечебницы (инфекционно-диагностической лаборатории) в г. Севастополе, в районе ул. Озерной"	ПИР	ноя.17	дек.23	№ 5-ПИР/2019 от 28.11.2019	1,1	0,0
		СМР	дек.23	дек.25	2-пср/2022 от 28.12.2022	140,6	0,0
73	Строительство площадки для размещения специальной печи (крематора- инсинератора)	ПИР	окт.23	мар.24	002000306922РУС 0007420017/7ПИР/2023 от 30.10.2023	6,4	0,0
		СМР	май.24	дек.25	-	3,2	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя, наименование объектов, мероприятий в рамках ГП РФ «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	Вид работ	Начало реализации	Завершение реализации	Государственные контракты (№, дата)	Объемы финансирования, предусмотренные в 2024 году, согласно соглашениям на 01.07.2024	Кассовое исполнение в 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						14 351,6	6 542,1
